



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DETERMINAZIONE**

N. 1424 del 01/12/2022

**Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE PALAZZINA "EX ORTOTRAUMA" PRESSO IL P.O. DI DOMODOSSOLA CON CONTESTUALE RIMOZIONE COPERTURA IN AMIANTO (CIG 91711597D2) – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO**

STRUTTURA: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

RESPONSABILE STRUTTURA: MATTALIA MARIO



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DETERMINAZIONE**

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca

Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## **IL RESPONSABILE SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE**

### **Premesso che:**

- con determinazione n. 357 del 06/04/2022 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di demolizione parziale della palazzina denominata "ex Ortotrauma" presso il P.O. di Domodossola, in quanto dismessa ed inagibile, in relazione alla sua parte prefabbricata, procedendo altresì alla contestuale rimozione del tetto di copertura in lastre di fibra di amianto;
- il suddetto progetto esecutivo prevedeva il seguente quadro economico:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 116.123,90
Oneri per la sicurezza ordinari	€ 3.591,46
Oneri per la sicurezza speciali	€ 10.495,92
<b>Totale lavorazioni</b>	<b>€ 130.211,28</b>
IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	€ 13.021,13
Imprevisti e arrotondamenti	€ 267,59
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 143.500,00</b>

- con determinazione n. 451 del 04/05/2022 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara avviata con la citata determinazione n. 357/2022, nei confronti della ditta Eco-Geotech S.r.l., con sede a Trontano (VB), che ha offerto un ribasso pari al 19,78% sull'importo posto a base di gara;

**Dato atto** che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori e differenti lavorazioni impreviste e non prevedibili in sede di progetto, in variante rispetto alle indicazioni progettuali originali a causa di diverse esigenze riscontrate;

**Rilevato** che tali esigenze comportano differenti lavori riguardanti prevalentemente:

- maggiori oneri inerenti la differenziazione degli strati costituenti le murature interne ed esterne, in modo da conferire i materiali alle pubbliche discariche;
- maggiori oneri per lo smaltimento alle pubbliche discariche e per la sistemazione del piano di calpestio;
- maggiori importi degli oneri speciali della sicurezza in merito all'applicazione dei piani di lavori, come da disposizioni degli organi competenti quali Spresal, SPP, DSO;

**Dato atto** altresì che, a parziale compenso delle suddette maggiori lavorazioni, non sono stati eseguiti i lavori di impermeabilizzazione della soletta e di recinzione della struttura rimanente;

**Dato atto** che - per i motivi sopra esposti - si è provveduto alla redazione di apposita Perizia di Variante, composta dai seguenti allegati:

1. Relazione di Perizia;
2. Computo metrico estimativo di progetto;
3. Computo metrico - costi speciali per la sicurezza - di progetto;
4. Capitolato speciale di appalto di progetto;



5. Computo metrico estimativo di perizia;
6. Computo metrico - costi speciali per la sicurezza - di perizia;
7. Quadro economico di raffronto - di perizia;
8. Bozza Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

**Dato atto** che, a seguito della sopra citata Perizia di Variante, il quadro economico di progetto risulta così modificato:

Nuovo importo dei lavori (al netto del ribasso)	€ 101.718,71
Oneri per la sicurezza ordinari	€ 3.921,03
Oneri per la sicurezza speciali	€ 23.019,53
<b>Totale lavorazioni</b>	<b>€ 128.659,27</b>
IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	€ 12.865,93
Imprevisti e arrotondamenti	€ ===
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 141.525,20</b>

**Preso atto** che, dalla citata Perizia di Variante, risulta un importo complessivo dei lavori pari a € 128.659,27 (al netto del ribasso d'asta), con un incremento complessivo rispetto all'importo aggiudicato pari a € 23.559,03 compresa IVA;

**Preso atto** altresì che il tempo utile di ultimazione dei lavori, contrattualmente fissato, non è stato prorogato in virtù della Perizia di Variante;

**Richiamato** quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 106, commi 1) e 2), in merito alla "modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", e riscontrata l'applicabilità di quanto in essi previsto;

**Preso atto** che la spesa di cui alla Perizia di Variante, pari a € 23.559,03 compresa IVA, trova imputazione come segue:

→ Aut. 222 sub 43 - Conto 1.12.02.11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022 (Fondi Propri);

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

## DETERMINA

1) **di approvare** la "Perizia di Variante" redatta in data 03/10/2022 relativamente ai lavori di demolizione parziale della palazzina denominata "ex Ortotrauma" presso il P.O. di Domodossola, a seguito della necessità di eseguire maggiori e differenti lavorazioni imprevedute e non prevedibili in sede di progetto, in variante rispetto alle indicazioni progettuali originali a causa di diverse esigenze riscontrate, anche alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 106, commi 1) e 2), in merito alla "modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", e riscontrata l'applicabilità di quanto in essi previsto;



2) **di dare atto** che tale Perizia è composta dai seguenti allegati:

1. Relazione di Perizia;
2. Computo metrico estimativo di progetto;
3. Computo metrico - costi speciali per la sicurezza - di progetto;
4. Capitolato speciale di appalto di progetto;
5. Computo metrico estimativo di perizia;
6. Computo metrico - costi speciali per la sicurezza - di perizia;
7. Quadro economico di raffronto - di perizia;
8. Bozza Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

3) **di approvare**, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, gli allegati n. 1) Relazione di Perizia, 7) Quadro economico di raffronto - di perizia e n. 8) Bozza Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, dando atto che i restanti elaborati sono conservati agli atti presso la S.o.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale;

4) **di dare atto** che il quadro economico di progetto, di cui alla determinazione n. 357 del 06/04/2022, risulta modificato come segue:

Nuovo importo dei lavori (al netto del ribasso)	€ 101.718,71
Oneri per la sicurezza ordinari	€ 3.921,03
Oneri per la sicurezza speciali	€ 23.019,53
<b>Totale lavorazioni</b>	<b>€ 128.659,27</b>
IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	€ 12.865,93
Imprevisti e arrotondamenti	€ ===
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 141.525,20</b>

5) **di dare atto** che il tempo utile di ultimazione dei lavori, contrattualmente fissato, non è stato prorogato in virtù della Perizia di Variante;

6) **di dare atto** che la spesa di cui alla suddetta Perizia di Variante, pari a € 23.559,03 compresa IVA, trova imputazione come segue:

→ Aut. 222 sub 43 - Conto 1.12.02.11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022 (Fondi Propri);


7) **di dare mandato** alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e s.m.i..

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.**

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



## DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO U10 DENOMINATO "EX TRAUMA" P.O. DI DOMODOSSOLA

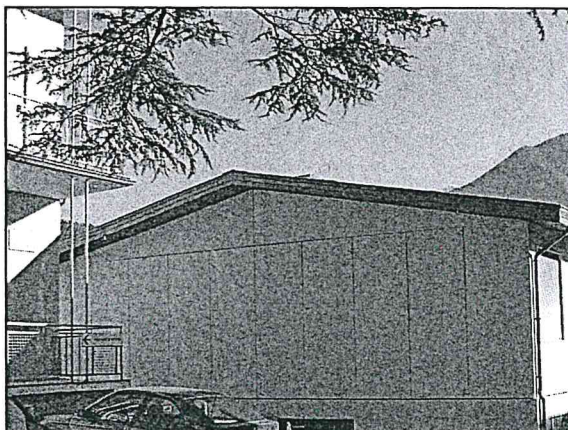

### PERIZIA DI VARIANTE IN SANATORIA

Elaborato: RELAZIONE DI PERIZIA

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Collaboratore tecnico  
S.O.S. Tecn. A.N.O.  
Geom. Silvio PIRONE

DATA: OTTOBRE 2022

AGG.:

LOC.: Domodossola

SCALA: 1-100

Committente:

ALLEGATO

1

S.O.S. Tecnico e Coord.  
Aziendale Nuovo Ospedale

REGIONE PIEMONTE  
A. S. L. V.C.O.

VISTO:

Il Responsabile Unico  
del Procedimento  
Ing. Mario MATTELLA





# Relazione perizia di variante

**Regione PIEMONTE**

**Provincia del V.C.O.**

**Stazione appaltante ASL VCO**

**Lavori di :** DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO U10  
DENOMINATO "EX TRAUMA" - P.O. DI DOMODOSSOLA-

**Impresa :** ECO-GEOTECH s.r.l. di Trontano (VB)

**Importo contrattuale :** Euro 107.241,97 oltre IVA AL 10%

**Codice identificativo gara . 91711597D2**

## **RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

**art. 8 comma 2 D.M. 49/2018**

### **Il progetto**

Con determinazione della struttura Tecnico Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale n. 357 del 06/04/2022, si approvava il Progetto esecutivo ,a firma del Dott. Ing. Mario MATTALIA, relativo ai lavori di demolizione parziale della palazzina denominata "ex Ortotrauma" presso il P.O. di Domodossola, in relazione alla sua parte prefabbricata, procedendo altresì alla contestuale rimozione del tetto di copertura in lastre di fibra di amianto, per un quadro economico complessivo pari ad Euro 143.500,00 così suddiviso:

- per lavori a base d'asta (esclusi oneri di sicurezza) : Euro 116.123,90-
- per oneri per la sicurezza : Euro 14.087,38-
- per somme a disposizione dell'amministrazione: Euro 13.288,72-

**TOTALE :** Euro 143.500,00

### **La gara d'appalto**

Con determinazione della struttura Tecnico Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale n. 357 del 06/04/2022 al dispositivo n. 3 si disponeva di attivare apposita procedura negoziata al fine di affidare i suddetti lavori.

Dopo le risultanze della gara si procedeva all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa ECO – GEOTECH S.R.L con sede in via Leonardo da Vinci,52 – 28859 Trontano (VB),risultata vincitrice come indicato dalla determina n. 451 del 04/05/2022 con ribasso del 19,78% , comportando un importo di aggiudicazione pari ad Euro 107.241,97 oltre IVA al 10%.

## **Adeguamenti e modifiche introdotti dalla perizia di variante**

Nei seguenti punti sono riportate tutte le parti del progetto originario che hanno richiesto degli interventi di adeguamento ed integrazione necessari ad una completa aderenza con la normativa, alla soluzione dei problemi funzionali riscontrati nella conduzione dei lavori.

Le variazioni si riassumano in problematiche di fasi di lavorazioni e problematiche inerenti gli oneri di sicurezza per la corretta applicazione dei piani di lavoro, approvati dagli organi competenti, in data successiva all'approvazione del progetto esecutivo, nonché disposizioni per adeguamento al DUVRI.

### **1)- PROBLEMATICHE IN FASE LAVORATIVE**

Durante l'esecuzione dei lavori è stato rilevato che le pareti interne e perimetrali del fabbricato da demolire era costituito da pannelli prefabbricati di tipo a sandwich costituito da pannelli esterni ed interni in lastre in legno con applicato lastra di cartongesso con interposto strato di materiale isolante in fibra di roccia. Di conseguenza, al fine di poter conferire il materiale di risulta alle Pubbliche Discariche, si è riscontrato un maggior onere economico dovuto al dover differenziare i vari componenti, nonché l'insaccatura e lo smaltimento del materiale isolante che si è dovuto adeguatamente scomporre e selezionare. Inoltre a seguito della rimozione del manto di copertura in lastre di eternit contenenti fibre di amianto si è potuto accuratamente valutare la composizione della reale struttura portante del tetto che si rilevava costituita anche da capriate in ferro, la cui rimozione ha comportato un maggior onere. A demolizioni ultimate si è riscontrato che il piano di calpestio della soletta si presentava in buone condizioni e quindi si è provveduto unicamente ad eseguire i necessari compensi e livellamenti riscontrati.

Rispetto al progetto esecutivo si è ritenuto di non provvedere alla impermeabilizzazione della soletta e la posa provvisoria di rete di protezione, utilizzando i relativi importi a compenso delle lavorazioni aggiuntive sopra descritte.

Il riscontro dei nuovi importi economici sono desumibili dal computo metrico di variante.

### **2)- PROBLEMATICHE INERENTI AGLI ONERI DI SPECIALI DI SICUREZZA**

A seguito dei piani di lavoro approvati dagli organi competenti sia per le lavorazioni in presenza di amianto (Spresal), sia per le problematiche inerenti all'interferenza delle lavorazioni con le attività sanitarie (DSO – SPP), si è riscontrato un maggior onere economico per gli oneri speciali della sicurezza, compensati a misura quali noleggio e posa di ponte e sottoponte al ponteggi esterni montati, rete di fibra sintetica a protezioni delle impalcature edili, trasporto ed installazione di monoblocco prefabbricato e



## Nuovi prezzi

Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 20 nuovi prezzi per le lavorazioni inerenti alle opere in appalto e n. 21 nuovi prezzi per gli oneri di sicurezza a misura. I nuovi prezzi inerenti alle lavorazioni sono stati assoggettati allo stesso ribasso d'asta di gara.

## Tempo di ultimazione

Il tempo utile di ultimazione dei lavori, contrattualmente fissato, non è stato prorogato in virtù della presente perizia

## Modalità di finanziamento

Gli oneri relativi alla presente perizia trova imputazione come di seguito indicato:

Aut. 222 sub 43 – Conto 1.12.02.11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022;

Finanziamento : Fondi Propri.

## Allegati

- 1)- Relazione di perizia
- 2)-Copia computo metrico di progetto
- 3)-Computo metrico della sicurezza di progetto
- 4)-Copia capitolato speciale d'appalto
- 5)-Computo metrico estimativo di perizia
- 6)-Computo metrico della sicurezza di perizia
- 7)- Quadro comparativo di confronto
- 8)\_ Bozza atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

Domodossola li


Il Direttore dei Lavori: Geom. Sauro PIRONE

Il Responsabile del procedimento : Ing. Mario MATTALIA





## DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO U10 DENOMINATO "EX TRAUMA" P.O. DI DOMODOSSOLA

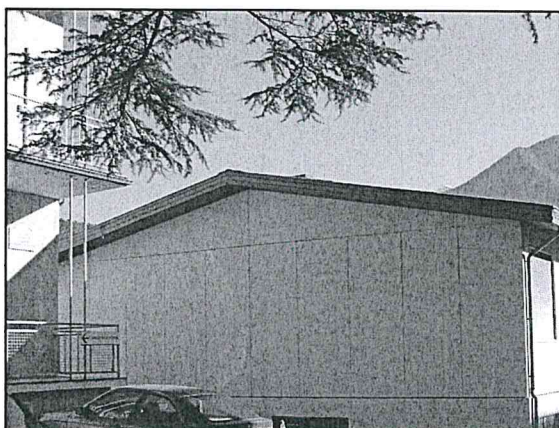

### PERIZIA DI VARIANTE IN SANATORIA

Elaborato: **QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO -  
- DI PERIZIA -**

<b>IL DIRETTORE DEI LAVORI:</b>  Il Collaboratore Tecnico D.S. T. C. A. N. Giovanni Saffro PIRONE	<b>DATA:</b> OTTOBRE 2022 <b>AGG.:</b>  <b>LOC.:</b> Domodossola <b>SCALA:</b> 1-100	<b>Committente:</b>	<b>ALLEGATO</b>  <b>7</b>
<b>S.O.S. Tecnico e Coord.</b> <b>Aziendale Nuovo Ospedale</b>	<b>REGIONE PIEMONTE</b> <b>A. S. L. V.C.O.</b>		<b>VISTO:</b> Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mario MAZZOLI 

# QUADRO RIASSUNTIVO DI RAFFRONTO

## IMPORTI DI PROGETTO

Importo lavori	119.715,36
a dedurre oneri di sicurezza non sog- getti a ribasso (3%)	- 3.591,46

-----

Importo a base d'asta 116.123,90

Oneri ordinari della sicurezza	3.591,46
-----------------------------------	----------

Oneri speciali della sicurezza	10.495,92
-----------------------------------	-----------

-----

TOTALE OPERE	130.211,28
IVA 10%	13.021,13
IMPREVISTI	267,59

-----

**TOTALE**  
**PROGETTO**    euro    **143.500,00**

## IMPORTI DI VARIANTE

Importo lavori	130.720,72
a dedurre oneri di sicurezza non sog- getti a ribasso (3%)	- 3.921,03

-----

Importo da scontare	126.799,69
a dedurre sconto di gara 19,78%	-25.080,98

-----

Importo scontato	101.718,71
------------------	------------

Oneri ordinari della sicurezza	3.921,03
-----------------------------------	----------

Oneri speciali della sicurezza	23.019,53
-----------------------------------	-----------

-----

TOTALE OPERE	128.659,27
IVA 10%	12.865,93
IMPREVISTI	====

-----


**TOTALE**  
**VARIANTE**    euro    **141.525,20**

\*Minor importo rispetto al progetto principale di euro 1.974,80 tenuto conto del recupero del ribasso d'asta





# DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO U10 DENOMINATO "EX TRAUMA" P.O. DI DOMODOSSOLA

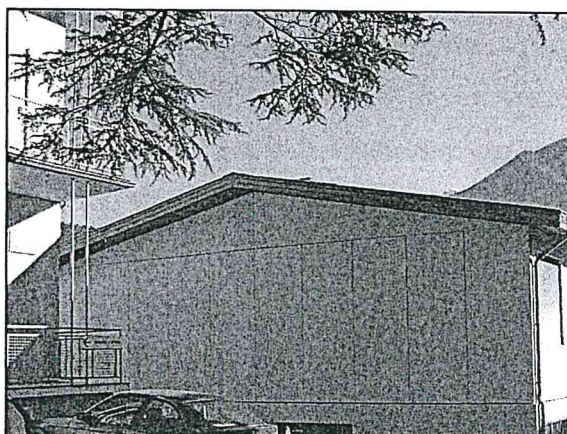

## PERIZIA DI VARIANTE IN SANATORIA

Elaborato: - BOZZA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI  
- CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Collaboratore tecnico

S.O.S. Tecnica

Geom. Sandro PIRONE

DATA: OTTOBRE 2022

AGG.:

LOC.: Domodossola

SCALA: 1-100

Committente:

ALLEGATO

8

S.O.S. Tecnico e Coord.  
Aziendale Nuovo Ospedale


REGIONE PIEMONTE  
A. S. L. V.C.O.

VISTO:

Il Responsabile Unico  
del Procedimento  
Ing. Mario MAZZALU







**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **SOS TECNICO COORD. AZIENDALE NUOVO OSPEDALE**

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143 Fax 0323 868181

e-mail [tecnico@aslvco.it](mailto:tecnico@aslvco.it)

# **Demolizione parziale del fabbricato U10 denominato "ex trauma" P.O. di Domodossola**

## **BOZZA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

**LAVORI:** Demolizione parziale del fabbricato U10 denominato "ex trauma" P.O. di domodossola-  
CIG: 91711597D2

**COMMITTENTE:** ASL VCO

**R.U.P.** Ing. Mario MATTALIA

**IMPRESA:** ECO-GEOTECH di Trontano (VB)

### **Premesso**

- che in data 04/05/2022 con determinazione SOS Tecano n.451, sono stati affidati i lavori di demolizione parziale del fabbricato U10 denominato "ex trauma" P.O. di Domodossola alla Ditta ECO-GEOTECH con sede a Trontano (VB) via Leonardo da Vinci n. 52 per un importo al netto del ribasso d'asta del 19,78% di € 107.241,97 iva 10% esclusa;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori e differenti lavorazioni, imprevedute e non prevedibili in sede di progetto, in variante rispetto alle indicazioni progettuali originali a causa di diverse esigenze riscontrate;
- che tali esigenze comportano differenti lavori riguardanti prevalentemente:
- maggiori oneri inerenti la differenziazione degli strati costituenti le murature, sia interne che esterne, in modo da conferire i materiali alle Pubbliche Discariche;
- maggiori oneri per lo smaltimento alle Pubbliche Discariche;
- maggiori oneri per la sistemazione del piano di calpestio;
- maggiori importi degli oneri speciali della sicurezza in merito all'applicazione dei piani di lavori come da disposizioni degli organi competenti quali Spresal, SPP, DSO;
- si precisa che a parziale compenso delle maggiori lavorazioni non sono stati eseguiti i lavori di impermeabilizzazione della soletta e la recinzione della struttura rimanente;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 128.659,27, per lavori al netto del ribasso d'asta del 19,78 %, di cui € 21.417,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che detta perizia suppletiva è in corso di approvazione;





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **SOS TECNICO COORD. AZIENDALE NUOVO OSPEDALE**

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143 Fax 0323 868181

e-mail [tecnico@aslvco.it](mailto:tecnico@aslvco.it)

# **Demolizione parziale del fabbricato U10 denominato "ex trauma" P.O. di Domodossola**

## **Verbale di concordamento nuovi prezzi**

(art. 14, co. 5, lett. d) e art. 22 co. 5 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

**LAVORI:** Demolizione parziale del fabbricato U10 denominato "ex trauma" P.O. di Domodossola  
CIG: 91711597D2

**COMMITTENTE:** ASL VCO

**R.U.P.** Ing. Mario MATTALIA

**IMPRESA** ECO-GEOTECH di Trontano (VB)

### **Premesso che**

in data 04/05/2022 con determinazione SOS Tecano n. 451, sono stati affidati i lavori di demolizione parziale del fabbricato U10 denominato "ex trauma" P.O. di Domodossola alla Ditta ECO-GEOTECH con sede in Trontano (VB) Via Leonardo da Vinci n. 52 i per un importo al netto del ribasso d'asta del 19,78% di Euro 107.241,97 iva 10% esclusa;

### **Visto che**

in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

l'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di Ottobre, in Domodossola, tra il sottoscritto Geom. Sauro Pi-rone. in qualità di Direttore dei Lavori, e il Sig. Mario Bentivoglio, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice ECO-GEOTECH, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi.

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

		cadauno	€	352,01
NP.003	Bagno chimico portatile			
		cadauno	€	132,26
NP.004	Quadro elettrico mobile per cantiere completo di certificazione			
		a corpo	€	860,81
NP.005	Dispersore a croce			
		cadauno	€	111,48
NP.006	Piastra di messa a terra			
		cadauno	€	61,00
NP.007	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie 250 x 100 mm e tubolari perimetrali tubolari prefabbricati di IB 38mm. Pannelli da 2.000 x 2.000 mm			
		cadauno	€	33,48
NP.008	Base per recinzione mobile delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm in plastica			
		cadauno	€	5,00
NP.009	Estintore carrellato a polvere			
		cadauno	€	10,84
NP. 010	Elmetto in policarbonato			
		cadauno	€	18,90



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Domodossola, 03/10/2022

L'Impresa ECO-GEOTECH

Il Direttore dei Lavori

*(Sig. Mario Bentivoglio)*

*(Geom.Sauro Pirone)*

Visto

Il Responsabile del Procedimento

*(Ing. Mario Mattalia )*
